S1

S3

FFL 98.07

SW7.01
CL: 97.52
IL: 96.07

SW6.02
CL: 97.69
IL: 96.34

SW5.00
CL: 98.12
IL: 96.90

SW5.01
CL: 98.00
IL: 96.80

SW7.03
CL: 97.54
IL: 95.91

SW6.05
CL: 97.55
IL: 95.90

VASCA DI ATTENUAZIONE
- 350m³ VOLUME
CL: 97.85; SOMMITA DELLA VASCA: 97.20
IL: 96.20

POZZETTO DI SCARICO A TESTA RIALZATA PROPOSTO

SW2.00
CL: 97.55
IL: 96.50

SW1.05
CL: 97.82
IL: 96.77

SW1.06
CL: 97.78
IL: 96.73

SW2.02
CL: 97.33
IL: 96.28

525mmØ @ 1:500

SW2.01
CL: 97.45
IL: 96.40

SW17.00
CL: 97.69
IL: 96.49

VASCA DI ATTENUAZIONE - 307m³ VOLUME
CL: 97.85; SOMMITA DELLA VASCA: 97.20
IL: 96.25

SW2.03
CL: 97.30
IL: 96.25

CAMERA DI POMPAGGIO PROPOSTA

SW4.00
CL: 97.41
IL: 96.36

SW3.01
CL: 97.36
IL: 96.31

CL: 97.70
IL: 96.40

CL: 97.70
IL: 96.60

CL: 97.90
IL: 96.80

CL: 97.70
IL: 96.60

CL: 97.90
IL: 96.80

CL: 97.90
IL: 96.80

ADMIN

GENERATOR

SW1.02
CL: 97.46
IL: 96.26

SW1.01
CL: 97.54
IL: 96.34

CL: 97.50
IL: 96.60

FFL 98.07

LEGENDA

- CONFINE DEL CANTIERE PROPOSTO
- RECINZIONE DI SICUREZZA DEL PERIMETRO
- SVILUPPO PROPOSTO
- STRADA ASFALTO PROPOSTA
- PIAZZALE PER ATTREZZATURE
- MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO PROPOSTO
- PAVIMENTAZIONE PERMEABILE
- RITENZIONE IDRICA
- SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA PROPOSTA
- FOSSATO ESISTENTE
- ZONA CUSCINETTO PAESAGGISTICO
- SW PROPOSTO
- CONDOTTA PRINCIPALE SW PROPOSTO
- VASCA DI ATTENUAZIONE
- CANALE DI DRENAGGIO PROPOSTO
- INTERCETTORE DI IDROCARBURI PROPOSTO
- CAMERA DI POMPAGGIO
- TETTO VERDE/BLU
- ACO CHANNEL PROPOSTO

NOTA
1. IL PROGETTO E I MATERIALI DELLE TUBAZIONI PROPOSTE PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEVONO ESSERE CONFORMI AI CODICI DI PRATICA LOCALI.

2. TUTTE LE INFRASTRUTTURE DI DRENAGGIO DEVONO ESSERE PROGETTATE IN CONFORMITÀ ALLE NORME EN 752, EN 12056 E AI CODICI DI PRATICA LOCALI.

3. I DETTAGLI DELLE TRINCEE PROPOSTI DEVONO ESSERE CONFORMI AI DETTAGLI TIPICI SUL DISEGNOÒ2_004-CSE-V1-XX-DR-C-3100>3101 O AI CODICI DI PRATICADOCALI, A SECONDA DI QUALE SIA PIÙ STRINGENTE.

A1

Tutte le dimensioni devono essere controllate in situ. Le quote figurate hanno preferenza sulle dimensioni in scala. Eventuali errori o discrepanze dovranno essere riportati agli architetti.
Questo disegno non sarà editato o modificato dal destinatario.

I diritti d'autore e la proprietà di questo disegno spettano a RKD Architects, il cui previo consenso scritto è necessario per il suo utilizzo, riproduzione o pubblicazione a terzi. Tutti i diritti riservati dalla legge sul diritto d'autore e dalle convenzioni internazionali sul diritto d'autore sono riservati a RKD Architects e possono essere protetti da procedimenti giudiziari di risarcimento per danni e/o ingiunzioni e spese.

PIANO DI RIFERIMENTO

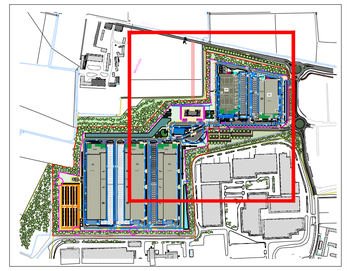

Rev.	Data	Descrizione
P03	18.07.2025	ISTANZA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
P02	17.12.2024	ISTANZA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
P01	18.11.2024	ISTANZA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

COMUNE
COMUNE DI LACCHIARELLA
PROVINCIA DI MILANO

COMMITTENTE
Apto

PROGETTISTI
RKD
Clifton Scannell Emerson Associates
Black&White
VCA Green

STATO	ISTANZA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PROGETTO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DATACENTER IN COMUNE DI LACCHIARELLA - INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA DI POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 150 MWt
INDIRIZZO	Lacchiarella Milano
TITOLO DWG	PIANO DEL CANTIERE - DRENAGGIO ACQUE METEORICHE TAVOLA 2
N. DISEGNO	SCML01 - CSE - XX - Z - D - C - 101022
REV	P03
PROGETTO N.	23332
SCALA	1:500
DATA	Ottobre 2024

Clifton Scannell Emerson Associates
